PROJET 7
Créez un tableau de bord dynamique avec PowerBI pour visualiser l'avancement de projets

ALLA Sofiane
Data Analyst
juillet 2025

SOMMAIRE :

I. Product Strategy Canvas
II. Préparation/nettoyage des données
III. Le modèle de données
IV. Tableau de bord de reporting

Entreprise : Sanitoral, société internationale qui fabrique et commercialise des soins bucco-dentaires
Mission : réaliser un tableau de bord via PowerBI
Interlocuteur.ice : Sophie - cheffe de projet au sein du service « Project Management Office » de Sanitoral

I. Product Strategy Canvas

Rédacteur	ALLA	**Date**	07/2025	**Nom du client**	Sanitoral

Veuillez vous appuyer sur la note de cadrage de la mission pour remplir le tableau ci-dessous.

Nom du tableau de bord : projet IT et marketing		**Objectif du dashboard :** piloter la performance des projets et de leur avancement	
Utilisateurs	**Stories**		
Directeur général (= DG)	En tant que DG, je veux être alerté à partir d'un certain seuil afin de prendre une décision sur l'arrêt ou la poursuite des projets	En tant DG, je veux un outils permettant de visualiser des écarts entre les coûts, les délais et les performances (par région et pays) afin de faire des analyses sur ces écarts	En tant DG, je veux des filtres et des alertes efficaces sur les projets (par région et pays) afin de prendre des décisions le plus rapidement possible
Directeur région (= DR)	En tant que DR, je veux être alertés sur les projets de ma région afin de pouvoir les suivre	En tant DR, je veux un outils permettant de visualiser des écarts entre les coûts, les délais et les performances (par pays) afin de faire des analyses sur ces écarts	En tant DR, je veux des filtres et des alertes efficaces sur les projets (par pays) afin de prendre des décisions le plus rapidement possible
Directeur pays (= DP)	En tant que DP, je veux avoir une vision sur les indicateurs des projets sur mon pays afin de prendre les mesures correctives	En tant DP, je veux un outils permettant de visualiser des écarts entre les coûts, les délais et les performances (dans mon pays) afin de faire des analyses sur ces écarts	En tant DP, je veux des filtres et des alertes efficaces sur les projets (dans mon pays) afin de prendre des décisions le plus rapidement possible

II. Préparation/nettoyage des données (1)

Importation des données à partir de fichiers Excel

Nettoyage des données pour éliminer les incohérences/erreurs

Transformation des données pour les rendre exploitables dans PowerBI

II. Préparation/nettoyage des données

+ création d’une colonne « Unique_Key »

+ renommer certaines colonnes (mettre des « _ », majuscule, etc)

+ importation dans PowerBI en utilisant (éventuellement) Power Query

C2 | =CONCAT(A2;"_";B2)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Project_ID	Phase	Unique_Key	Start Date	Planned_Duration	Planned_Cost	Planned_Delivrable
2	1	Phase 1 - Planning	1_Phase 1 - Planning	16/01/2018	196	50000	10

III. Le modèle des données (1)

Schéma du modèle de données montrant les connexions entre les tables (relations)

Explication des champs clés : Project_ID, Project_Type, Country, Phase, Start Date, etc

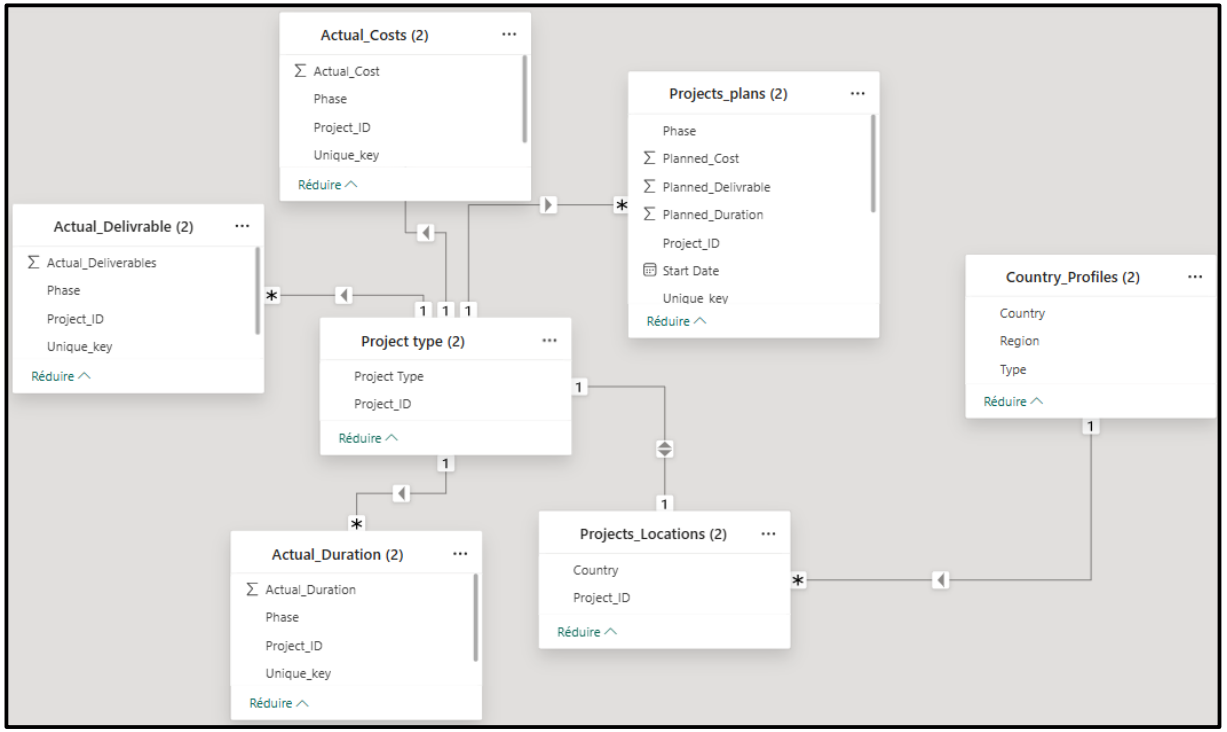

III. Le modèle des données (2)

On attribue des rôles à chacune des parties prenantes

- directeur région
- directeur pays
- directeur général (pas de « restriction »)

IV. Tableau de bord de reporting (1)

Region	Country	Ecart duree total	Ecart date total	Ecart cout total	Alerte retard	Alerte avance
		-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %	Alerte retard	
Region	Country	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %	Alerte retard	
North and Latin America	Equateur	-5,54 %	2,70 %	21,37 %		Alerte avance
Central/Eastern Europe-Middle East-Africa	Bielorussie	-7,15 %	3,49 %	-3,93 %		
Central/Eastern Europe-Middle East-Africa	Senegal	0,22 %	3,90 %	8,48 %		
Central/Eastern Europe-Middle East-Africa	Egypte	94,70 %	4,40 %	27,08 %		Alerte avance
North and Latin America	Canada	-16,90 %	4,44 %	0,06 %	Alerte retard	
Central/Eastern Europe-Middle East-Africa	Jordanie	3,04 %	4,44 %	0,23 %		
Central/Eastern Europe-Middle East-Africa	Macedoine	-37,58 %	4,79 %	29,79 %	Alerte retard	Alerte avance
Central/Eastern Europe-Middle East-Africa	Gabon	-35,71 %	4,84 %	-10,04 %	Alerte retard	
Central/Eastern Europe-Middle East-Africa	Malte	-7,97 %	4,84 %	-11,15 %		
North and Latin America	Bresil	-14,26 %	5,00 %	6,29 %		
Central/Eastern Europe-Middle East-Africa	Benin	13,45 %	5,06 %	-5,88 %		
Central/Eastern Europe-Middle East-Africa	La Reunion	-6,00 %	5,30 %	-1,81 %		
Central/Eastern Europe-Middle East-Africa	Croatie	-9,10 %	5,73 %	25,86 %		Alerte avance
Western Europe	Luxembourg	-30,22 %	6,31 %	20,68 %	Alerte retard	Alerte avance
Central/Eastern Europe-Middle East-Africa	Albanie	-4,00 %	6,45 %	17,68 %		Alerte avance
Central/Eastern Europe-Middle East-Africa	Liban	16,33 %	7,35 %	24,47 %		Alerte avance
Total		**-13,43 %**	**11,72 %**	**7,29 %**		

Ecart cout total, Ecart date total et Ecart duree total par Country

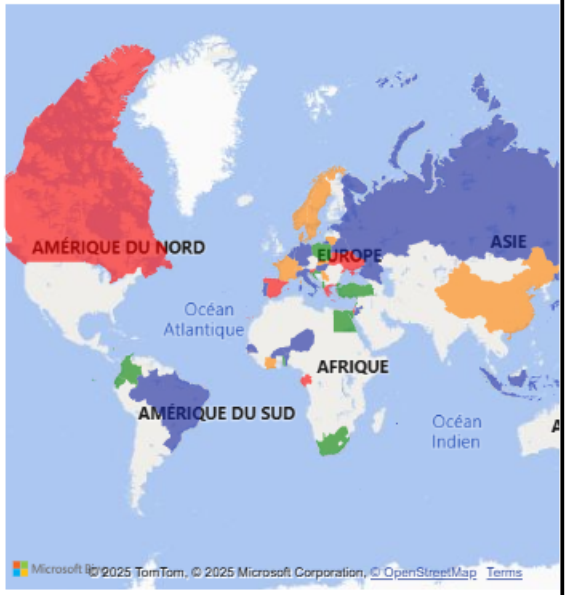

IV. Tableau de bord de reporting (2)

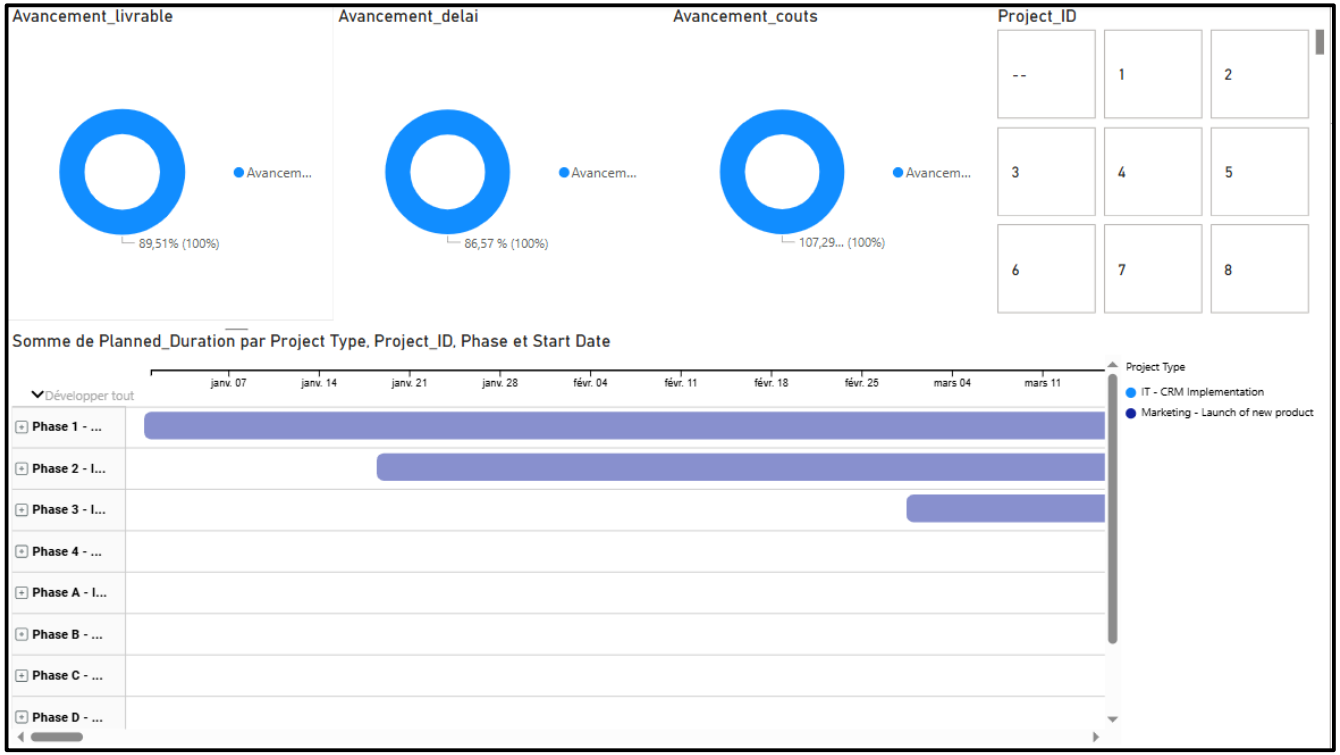

IV. Tableau de bord de reporting (3)

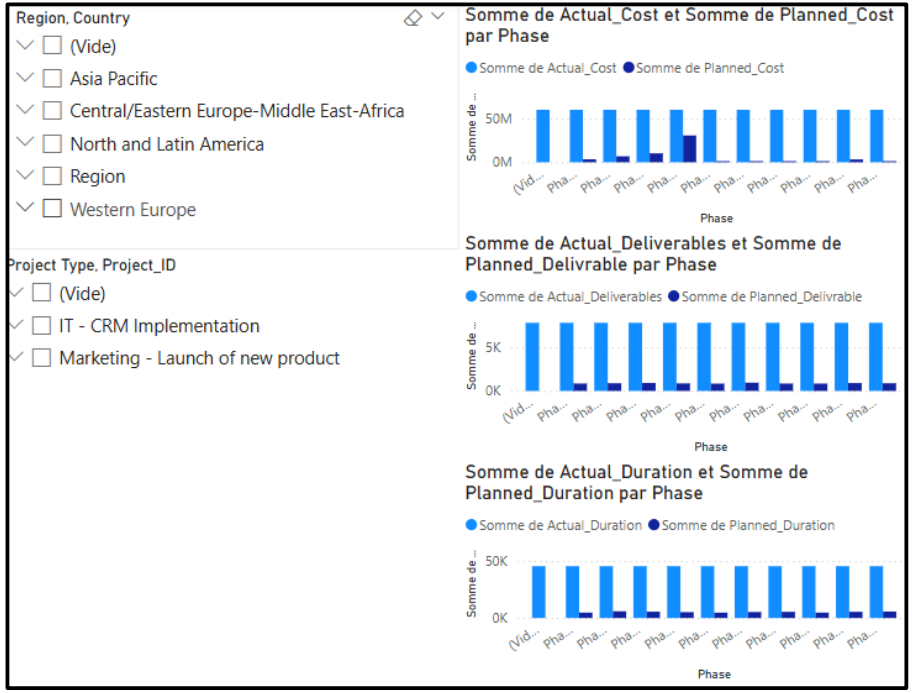

IV. Tableau de bord de reporting (4)

1) Importer des nouvelles données

A partir de l'accueil, importez votre fichier de mise à jour (par exemple classeur Excel).
Sélectionnez votre fichier de mise à jour, puis cliquez sur ouvrir



2) Actualiser les données

Après l'import du fichier, vous pouvez retourner dans le menu Accueil et cliquez sur le bouton Actualiser. Cela mettra à jour toutes les tables avec les données récentes.



3) Vérifier et traiter les informations

Ensuite si vous cliquer sur « transformer les données ». Vous accédez à une nouvelle fenêtre : « Power Query Editor », Vous accédez au détail des étapes de transformations appliquées au données (Alias : le modèle de donnée)



4) Appliquer les changements

Avec ou sans correction, lorsque vous voulez quitter Power Query Editor, il suffit de cliquer sur fermer et appliquer.



5) Consultation des visuels mis à jour

Vous êtes dans « affichage du rapport », vous pouvez parcourir à nouveau les différents visuels du tableau de bord avec les nouvelles données implémentées.



6) Sauvegarder le rapport mis à jour

N'oubliez pas de sauvegarder votre nouveau rapport via Fichier puis enregistrez dans le dossier que vous souhaitez.

IV. Tableau de bord de reporting (5)

Indicateurs clés :

- coûts des projets
- respect des délais des projets
- livrables produits par les projets par rapport au planning

Visualisations :

- carte du monde avec un jeu de couleurs pour voir les pays où les projets sont le plus en retard
- graphiques variés pour représenter les données de manière visuelle

Fonctionnalités supplémentaires :

- diagramme de Gantt pour visualiser les projets
- boîte de questions/réponses pour permettre aux utilisateurs de demander des visualisations supplémentaires
- utilisation des infos bulles pour apporter des détails supplémentaires

Conclusion

+ personnalisation

+ tableau de bord adapté

Importance du tableau de bord pour la gestion des projets chez Sanitoral

Prochaines étapes :

- mise à jour régulière des données
- formation des utilisateurs
- améliorations continues du tableau de bord
